Comisión 7

PLAN RSGR

Valores de impacto: 4 Catastrófico, 3 Crítico, 2 Marginal, 1 Despreciable

Riesgo	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Puntaje / nivel	Mitigación	Monitoreo	Gestión / contingencia
Cambio de dueños o accionistas de la aerolínea	Riesgo de direccion	5%	3	3 / Bajo riesgo	Establecer formalmente las condiciones y compromisos asumidos por la aerolínea, independientemente de posibles cambios en su composición accionaria.	Realizar un seguimiento de cambios en la composición accionaria y en las autoridades de la aerolínea, verificando si estos cambios pueden afectar los acuerdos o condiciones comerciales vigentes.	Solicitar una reunión con la nueva administración para presentar los resultados obtenidos y revisar los acuerdos vigentes en el contrato establecido.
Brecha de seguridad	Riesgo técnico	15%	4	4 / Bajo riesgo	Los datos de las tarjetas no se almacenan en el sistema propio, sino que se delegan a la pasarela de pago mediante tokenización. Toda la comunicación se realiza vía HTTPS, se valida la información ingresada por el usuario antes de procesarla, y las contraseñas se almacenan hasheadas, nunca en texto plano.	Logs de accesos e intentos de autenticación fallidos, con alertas ante patrones anómalos (fuerza bruta, accesos desde ubicaciones inusuales); escaneo periódico de dependencias en busca de vulnerabilidades conocidas.	Plan de respuesta ante incidentes (quién notifica, a quién, y en qué plazo, considerando además posibles obligaciones legales de notificar a usuarios afectados); rotación inmediata de credenciales y tokens comprometidos; proceso de comunicación a los usuarios afectados


Comisión 7

Degradación de rendimiento por alta concurrencia	Riesgo técnico	40%	4	8 / Riesgo medio	Realizar pruebas de carga antes de la puesta en producción para determinar la capacidad máxima del sistema. Optimizar el uso de recursos y establecer mecanismos de escalabilidad para soportar incrementos de usuarios simultáneos.	Configurar alertas automáticas que avisen al equipo técnico de inmediato cuando el sistema empiece a ponerse lento o los servidores alcancen su límite.	Aumentar temporalmente la capacidad de los servidores. Si la saturación continúa, implementar una sala de espera para que los usuarios ingresen de a poco o desactivar temporalmente las funciones que más pesan en el sistema.
Concurrencia en check-in	Riesgo Técnico	40%	3	6 / Bajo riesgo	Al momento de seleccionar un asiento, aplicar un lock de corta duración (ej. 5 minutos) que lo retiene mientras el usuario completa el check-in; si no confirma en ese lapso, el asiento se libera automáticamente. La confirmación final se hace con una operación atómica en la base de datos para evitar que dos usuarios lo confirmen a la vez.	Métrica de cuántos usuarios intentan seleccionar un asiento ya bloqueado; tiempo promedio que tarda un usuario en completar el check-in una vez que bloquea el asiento, para chequear si el tiempo del bloqueo es adecuado.	Si el asiento elegido se liberó por timeout antes de que el usuario confirmara, mostrarle inmediatamente el mapa de asientos actualizado para que elija otro; si dos usuarios llegan a confirmar el mismo asiento por una falla del lock, resolver por orden de llegada y reasignar automáticamente un asiento equivalente al que quedó afuera
Resistencia al cambio tecnológico del personal	Riesgo de negocio	50%	3	6 / Bajo riesgo	Capacitar al personal antes del lanzamiento con instancias de entrenamiento y documentación clara del nuevo sistema; involucrar a usuarios clave desde etapas tempranas para reducir el rechazo.	Recopilar comentarios del personal durante las primeras etapas de uso y realizar un seguimiento de las dificultades o errores frecuentes en la utilización del sistema.	Reforzar la capacitación en las áreas con más dificultades; mantener soporte cercano (mesa de ayuda) durante las primeras semanas post-lanzamiento.

Comisión 7

Subutilización de la App móvil por los usuarios	Riesgo de mercado	45%	2	4 / Bajo riesgo	Ofrecer beneficios, descuentos o funciones exclusivas que solo estén disponibles a través de la app. Asegurar un diseño simple y realizar una campaña de comunicación clara explicando sus ventajas antes y durante el lanzamiento.	Medir periódicamente la cantidad de usuarios activos y la tasa de desinstalación. Leer las reseñas y calificaciones en las tiendas de aplicaciones para identificar rápidamente qué frena o frustra a los usuarios.	Enviar encuestas breves a los usuarios inactivos para entender los motivos de su abandono. Lanzar campañas de reactivación con incentivos puntuales (como cupones) y ajustar las funciones de la app en base a las críticas recibidas.
Inestabilidad o fallas en APIs y servicios externos	Riesgo técnico	75%	3	9 / Riesgo medio	Implementar manejo de errores y reintentos ante fallos de APIs externas; diseñar el sistema para que estas dependencias no bloqueen el flujo principal si es posible.	Monitoreo de disponibilidad y tiempo de respuesta de cada API externa integrada	Alternativas o fallbacks definidos para los servicios críticos (ej. segundo proveedor); comunicación clara al usuario si una funcionalidad depende de un servicio caído.
Integraciòn de API de WhatsApp	Riesgo de presupuesto	80%	2	8 / Riesgo medio	Evaluar y contratar el proveedor de WhatsApp Business API antes de comprometerlo en el cronograma (investigación de costos ya identificada como parte del riesgo); diseñar el envío como un servicio desacoplado y no bloqueante del flujo de compra	Monitoreo de disponibilidad de la API y de la tasa de éxito de envío de PDFs	Si falla WhatsApp, permitir la descarga del PDF desde la web/app

Comisión 7

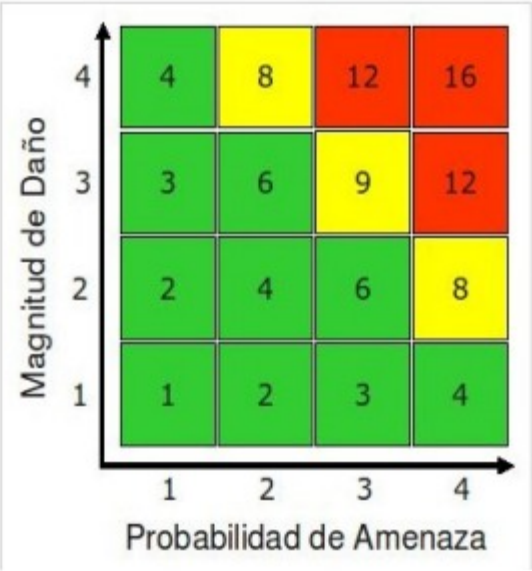

Para calcular el puntaje del riesgo usamos la siguiente tabla:
Donde la probabilidad de amenaza es:
1: 0% - 25%
2: 26% - 50%
3: 51% - 75%
4: 76% - 100%

Y la magnitud de daño coincide con los valores de impacto
