| | | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **SKY LINK** | **94 days?** | **8/27/26, 8:00AM** | **11/28/26, 5:00PM** | | |
| 2 | | 1.4 Gestionar cambios de alcance | 94 days? | 8/27/26, 8:00AM | 11/28/26, 5:00PM | | |
| 3 | | **Start Up** | **18 days** | **8/27/26, 8:00AM** | **9/13/26, 5:00PM** | | |
| 4 | | 1.1 Confeccionar el plan del proyecto | 18 days | 8/27/26, 8:00AM | 9/13/26, 5:00PM | | |
| 5 | | 1.2 Gestionar riesgos | 18 days | 8/27/26, 8:00AM | 9/13/26, 5:00PM | | |
| 6 | | **Sprint 0** | **14 days?** | **9/14/26, 8:00AM** | **9/27/26, 5:00PM** | **3** | |
| 7 | | 2.1 Relevar requerimientos con el cliente | 2 days? | 9/14/26, 8:00AM | 9/15/26, 5:00PM | | |
| 8 | | 2.2 Especificar requerimientos funcionales | 9 days | 9/16/26, 8:00AM | 9/24/26, 5:00PM | 7 | |
| 9 | | 2.3 Especificar requerimientos no funcionales | 9 days | 9/16/26, 8:00AM | 9/24/26, 5:00PM | 7 | |
| 10 | | 2.4 Validar requerimientos con stakeholders | 2 days? | 9/25/26, 8:00AM | 9/26/26, 5:00PM | 8;9 | |
| 11 | | 1.3 Reportar el estado por sprint | 1 day? | 9/27/26, 8:00AM | 9/27/26, 5:00PM | 10 | |
| 12 | | **Sprint 1** | **14 days?** | **9/28/26, 8:00AM** | **10/11/26, 5:00PM** | **6** | |
| 13 | | 3.1 Diseñar la arquitectura del sistema | 3 days | 9/28/26, 8:00AM | 9/30/26, 5:00PM | | |
| 14 | | 3.2 Diseñar el modelo de datos | 2 days | 10/1/26, 8:00AM | 10/2/26, 5:00PM | 13 | |
| 15 | | 3.5 Diseñar las integraciones externas | 2 days | 10/1/26, 8:00AM | 10/2/26, 5:00PM | 13 | |
| 16 | | 3.3 Diseñar la UI/UX web | 3 days? | 9/28/26, 8:00AM | 9/30/26, 5:00PM | | |
| 17 | | 4.1 Implementar el backend y la base de datos | 4 days | 10/3/26, 8:00AM | 10/6/26, 5:00PM | 14;15 | |
| 18 | | 4.2 Implementar autenticación y perfiles | 2 days | 10/7/26, 8:00AM | 10/8/26, 5:00PM | 16;17 | |
| 19 | | 4.3 Implementar la gestión de vuelos | 2 days | 10/7/26, 8:00AM | 10/8/26, 5:00PM | 17 | |
| 20 | | 4.4 Implementar la búsqueda de vuelos | 1 day | 10/9/26, 8:00AM | 10/9/26, 5:00PM | 19 | |
| 21 | | 6.1 Definir el plan y los casos de prueba | 2 days | 9/28/26, 8:00AM | 9/29/26, 5:00PM | | |
| 22 | | 6.2 Ejecutar pruebas unitarias | 1 day? | 10/10/26, 8:00AM | 10/10/26, 5:00PM | 18;20;21 | |
| 23 | | 1.3 Reportar el estado por sprint | 1 day? | 10/11/26, 8:00AM | 10/11/26, 5:00PM | 22 | |
| 24 | | **Sprint 2** | **14 days?** | **10/12/26, 8:00AM** | **10/25/26, 5:00PM** | **12** | |
| 25 | | 4.5 Implementar la compra de pasajes | 3 days? | 10/12/26, 8:00AM | 10/14/26, 5:00PM | | |
| 26 | | 4.6 Implementar la gestión de pagos y factur... | 4 days? | 10/15/26, 8:00AM | 10/18/26, 5:00PM | 25 | |
| 27 | | 4.8 Implementar el control de ocupación | 2 days? | 10/15/26, 8:00AM | 10/16/26, 5:00PM | 25 | |
| 28 | | 4.10 Implementar cancelaciones y reubicación | 3 days? | 10/19/26, 8:00AM | 10/21/26, 5:00PM | 26 | |
| 29 | | 4.7 Implementar el check-in y selección de asi.. | 4 days? | 10/15/26, 8:00AM | 10/18/26, 5:00PM | 25 | |
| 30 | | 4.9 Implementar las notificaciones | 2 days? | 10/22/26, 8:00AM | 10/23/26, 5:00PM | 28 | |
| 31 | | 4.11 Implementar pasajes electrónicos (PDF) | 2 days? | 10/19/26, 8:00AM | 10/20/26, 5:00PM | 26;29 | |
| 32 | | 6.1 Definir el plan y los casos de prueba | 3 days? | 10/12/26, 8:00AM | 10/14/26, 5:00PM | | |
| 33 | | 6.2 Ejecutar pruebas unitarias | 1 day? | 10/24/26, 8:00AM | 10/24/26, 5:00PM | 27;30;31;32 | |
| 34 | | 1.3 Reportar el estado por sprint | 1 day? | 10/25/26, 8:00AM | 10/25/26, 5:00PM | 33 | |
| 35 | | **Sprint 3** | **21 days** | **10/26/26, 8:00AM** | **11/15/26, 5:00PM** | **24** | |
| 36 | | 6.3 Ejecutar pruebas de integración | 4 days | 10/26/26, 8:00AM | 10/29/26, 5:00PM | | |
| 37 | | 6.4 Ejecutar pruebas de sistemas y UAT | 4 days | 10/30/26, 8:00AM | 11/2/26, 5:00PM | 36 | |
| 38 | | 3.4 Diseñar los prototipos de la app movil | 5 days | 10/26/26, 8:00AM | 10/30/26, 5:00PM | | |
| 39 | | 5.1 Configurar la base multiplataforma y nav... | 3 days | 10/31/26, 8:00AM | 11/2/26, 5:00PM | 38 | |
| 40 | | 5.2 Implementar búsqueda y compra en la app | 4 days | 11/3/26, 8:00AM | 11/6/26, 5:00PM | 39 | |
| 41 | | 5.3 Implementar check-in y tickets en la app | 4 days | 11/7/26, 8:00AM | 11/10/26, 5:00PM | 40 | |
| 42 | | 5.4 Implementar notificaciones e historial | 4 days | 11/11/26, 8:00AM | 11/14/26, 5:00PM | 41 | |
| 43 | | 1.3 Reportar el estado por sprint | 1 day | 11/15/26, 8:00AM | 11/15/26, 5:00PM | 37;42 | |
| 44 | | **Sprint 4** | **13 days** | **11/16/26, 8:00AM** | **11/28/26, 5:00PM** | **35** | |
| 45 | | 7.1 Preparar el entorno de producción | 3 days | 11/16/26, 8:00AM | 11/18/26, 5:00PM | | |
| 46 | | 7.2 Migrar los datos existentes | 2 days | 11/19/26, 8:00AM | 11/20/26, 5:00PM | 45 | |
| 47 | | 7.3 Capacitar al personal | 2 days | 11/16/26, 8:00AM | 11/17/26, 5:00PM | | |
| 48 | | 7.4 Desplegar web y publicar la app | 3 days | 11/21/26, 8:00AM | 11/23/26, 5:00PM | 46;47 | |
| 49 | | 6.5 Ejecutar pruebas de rendimiento/concurr... | 2 days | 11/24/26, 8:00AM | 11/25/26, 5:00PM | 48 | |
| 50 | | 6.6 Ejecutar pruebas de seguridad | 2 days | 11/24/26, 8:00AM | 11/25/26, 5:00PM | 48 | |
| 51 | | 7.5 Realizar la auditoría post-implementación | 2 days | 11/26/26, 8:00AM | 11/27/26, 5:00PM | 49;50 | |
| 52 | | 1.3 Reportar el estado por sprint | 1 day | 11/28/26, 8:00AM | 11/28/26, 5:00PM | 51 | |

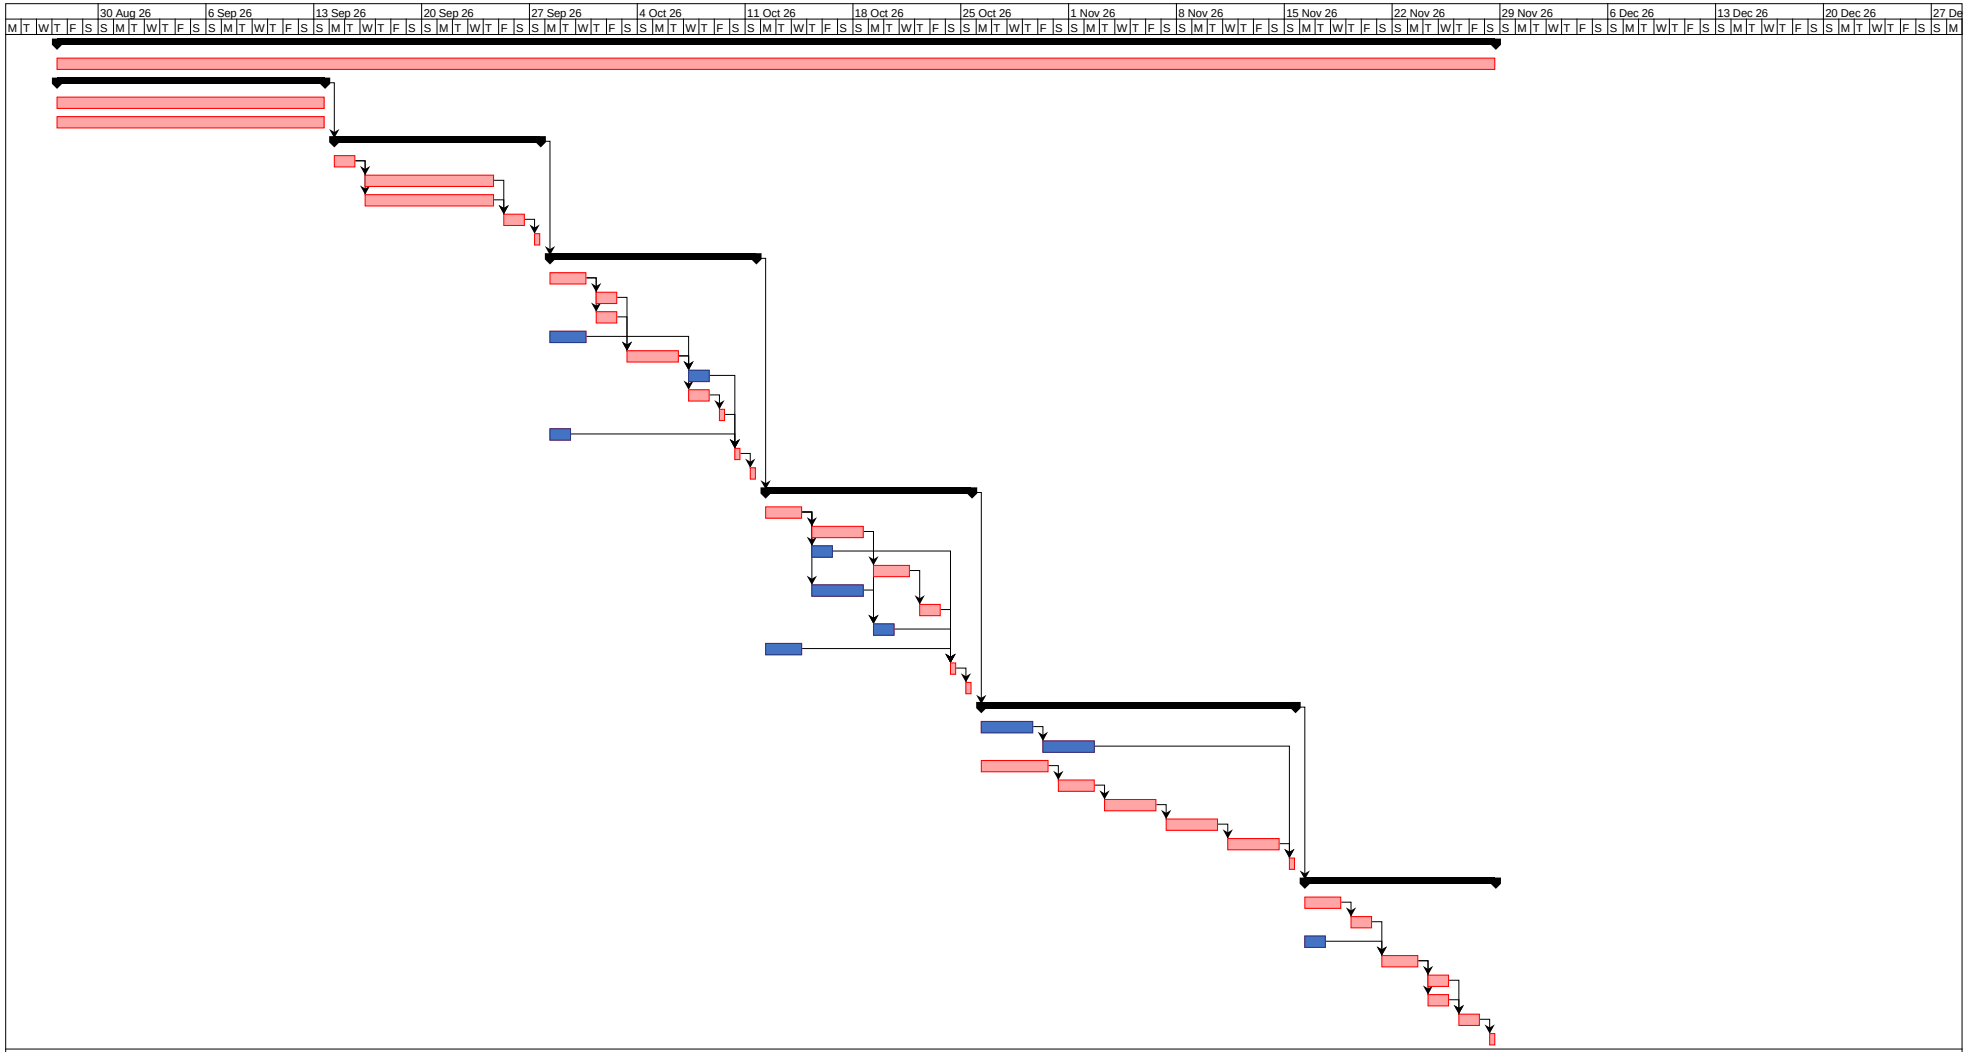
30 Aug 26
6 Sep 26
13 Sep 26
20 Sep 26
27 Sep 26
4 Oct 26
11 Oct 26
18 Oct 26
25 Oct 26
1 Nov 26
8 Nov 26
15 Nov 26
22 Nov 26
29 Nov 26
6 Dec 26
13 Dec 26
20 Dec 26
27 De
